# Aufmaßprotokoll

| | | |
|---|---|---|
| BV: | **Marienkirchstraße in Stendal**<br>**Regenwasserkanal** | **AMB02** |
| AG: | **Hansestadt Stendal** | |
| Projektnr.: | | |
| Haltungsnr.: | **02** | **»von« Schacht ( 03 ) R 201-1a »nach« Schacht ( 04 ) R 200-1** |

***»von« Schacht ( 03 ) R 201-1a*** ***»nach« Schacht ( 04 ) R 200-1***

***R 201-1a --- R 200-1***

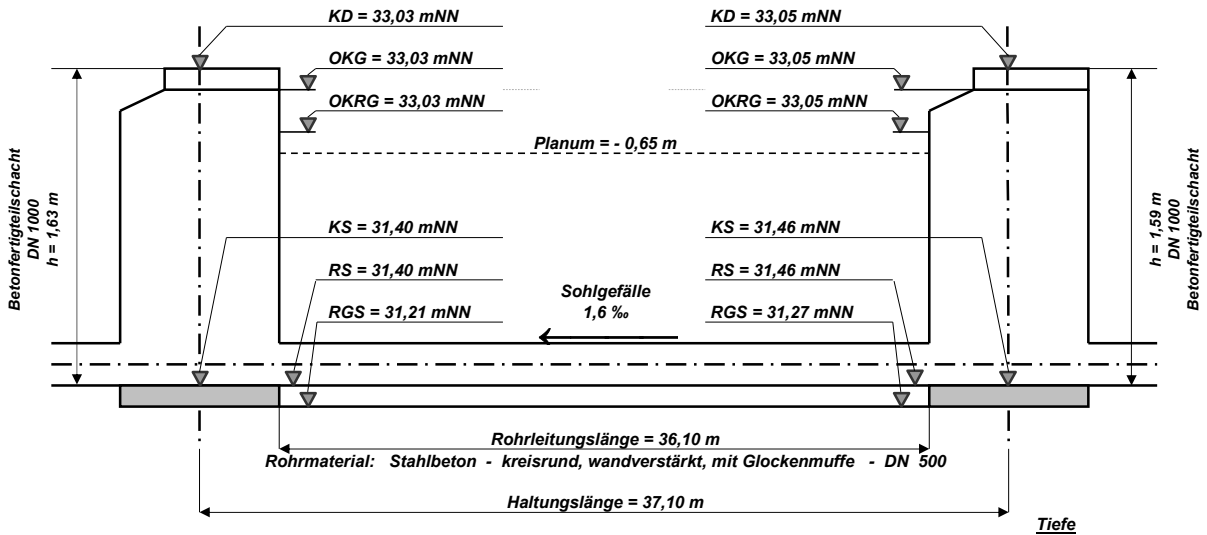


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ***Tiefe*** | |
| ***mittlere Grabentiefe*** | ***= (( 33,03 - 31,21 ) + ( 33,05 - 31,27 )) / 2 = 1,80 m*** | ***Aufbruch*** | ***= 0,20 m*** | |
| ***mittlere Grabenbreite*** | ***= 1,67 m*** | ***Graben-Aushub*** | ***= 1,60 m*** | |
| ***Verbau*** | ***= 0,15 m*** | | | |
| | | ***Rohr-Auflager*** | ***= 0,10 m*** | ***mit BA*** |
| | | ***Rohr-Leitungszone*** | ***= 0,97 m*** | ***mit BA*** |
| | | ***Hauptverfüllung*** | ***= 0,08 m*** | ***mit BA*** |

***Skizze Oberflächenbefestigungen / Abzweige :***




***Skizze querende Leitungen :***

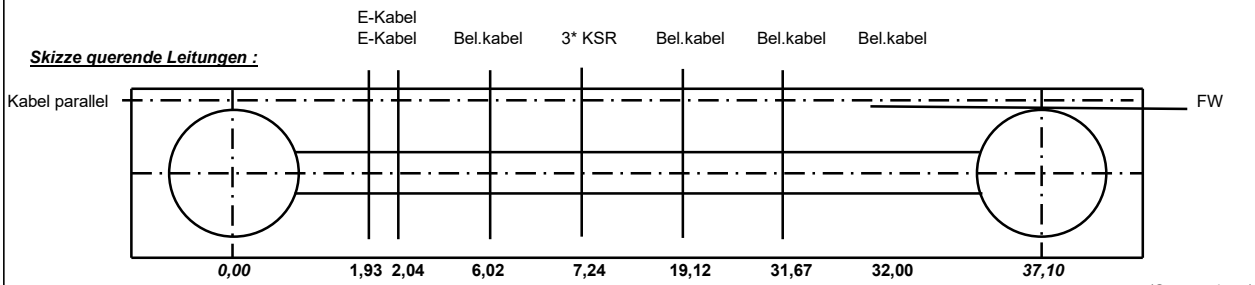


| | | | | | | | (Summe in m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zulage Hand in Meter | **1,11** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **6,11** |
| Suchgraben im Meter | **1,11** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **6,11** |

Auftragnehmer: Die Richtigkeit des Aufmaßes bestätigt: Bauleitung:
